


Miljø regnskab.

| | Fliskedel | | Solfanger | | Pillekedeler | | Oliekedel | | Gaskedel | | Total | |
|-------------|-----------|------|-----------|------|--------------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|-----|
| | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % |
| År til Dato | 47027,2 | 81,3 | 7310 | 12,6 | 3505 | 6,1 | 3 | 0,0 | 8 | 0,0 | 57853,5 | 100 |

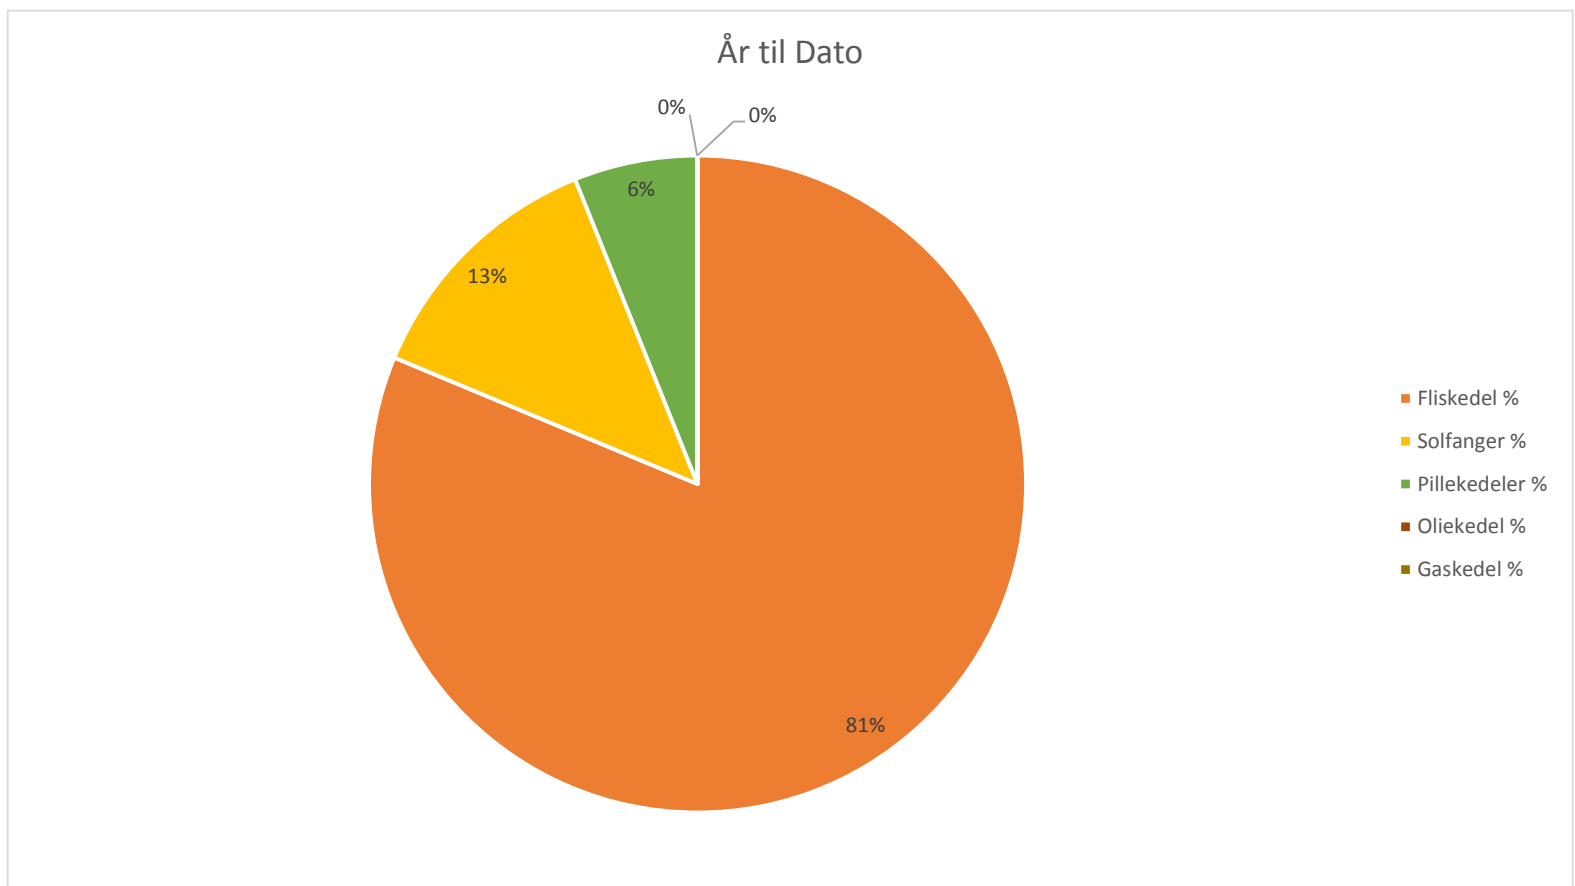

| | | | |
|---|---|---|----------|
| Fliskedelen har afbrændt | 16802 Tons flis | | |
| Leveret mængde flis | 16456 Tons flis | | |
| Af dem er | 10535 Tons skovflis med cetificat | | |
| | 3276 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav) | | |
| | 2645 Tons Have/park flis uden certificat (Ingen krav) | | |
| Pillekedelerne har brugt | 726 Tons piller | | |
| Fliskedelen har brugt | 0 Tons piller | | |
| Træpiller købt Year To Date | 675 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR) | | |
| Energiforbruget til produktion og transport af flisen | 17505 GJ | = | 4862 MWh |
| Energiforbruget for at lave flisen til varme | 2004 GJ | = | 557 MWh |
| Energiforbruget til distribution | 814 GJ | = | 226 MWh |
| <u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u> | | | |
| Renset spildevand fra processen | 7808 m3 | | |
| Aske kørt til deponi | 27 Tons | | |
| Aske brugt til gødning af jorden | 122 Tons | | |
| <u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u> | | | |
| Natronlud | 11440 kg | | |
| Polyaluminiumklorid | 6000 kg | | |
| Saltsyre | 0 kg | | |
| Metclear 15 | 125 kg | | |
| Flokkuleringsmiddel | 325 kg | | |
| HydroX | 140 kg | | |
