


Miljø regnskab.

	Fliskedel		Solfanger		Pillekedeler		Oliekedel		Ådum		Total	
	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%
År til Dato	45345,4	84,3	7570	14,1	648	1,2	2	0,0	209,455	0,4	53775,16	100

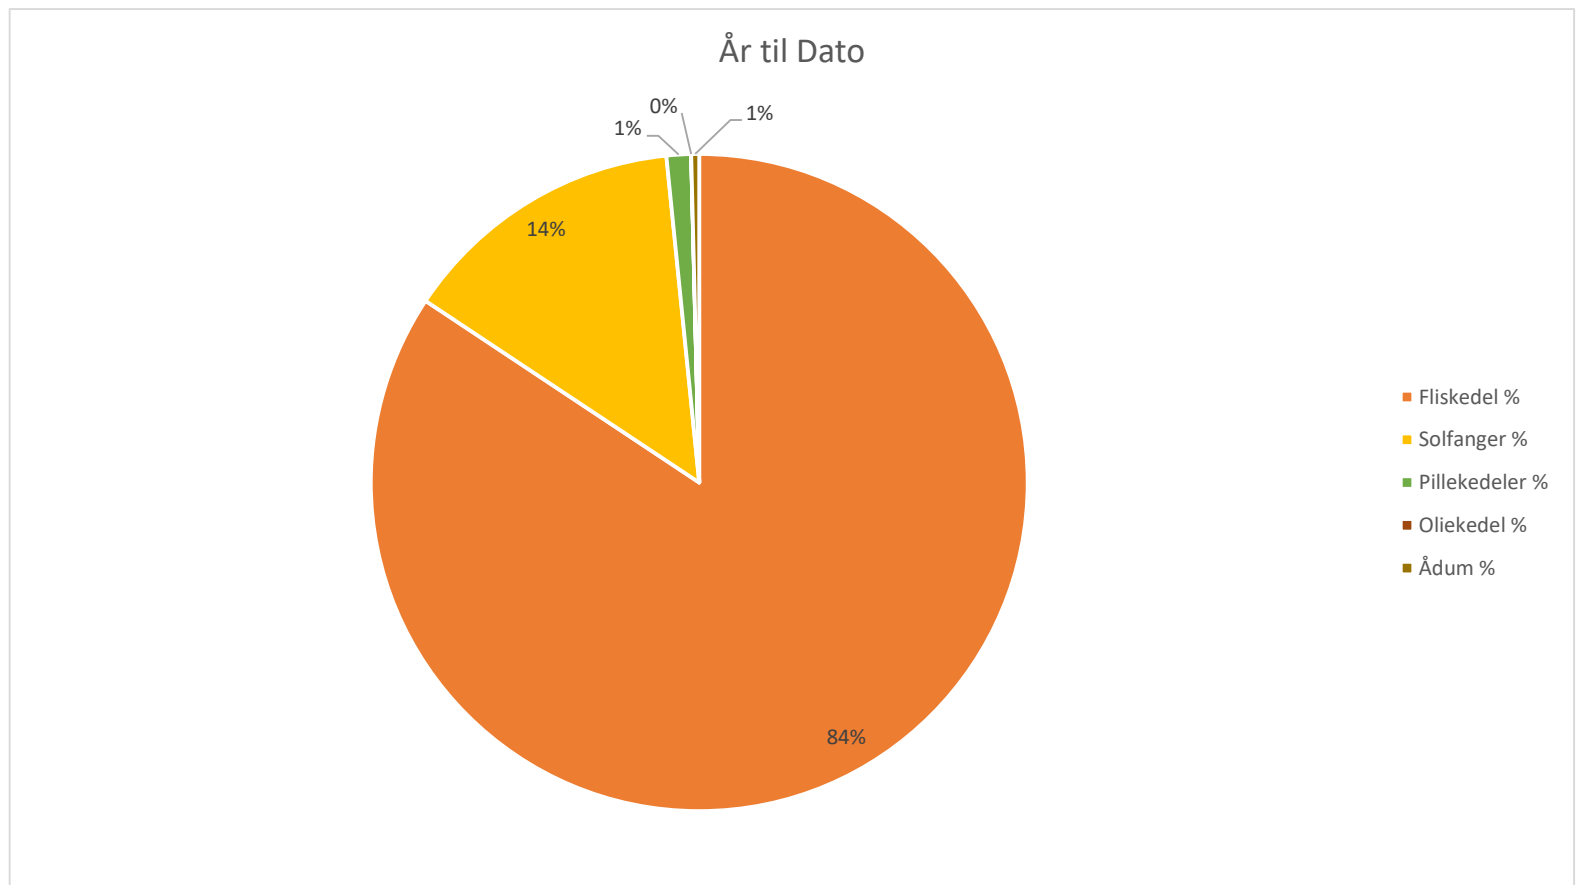

Fliskedelen har afbrændt	17721 Tons flis		
Leveret mængde flis	16856 Tons flis		
Af dem er	12559 Tons skovflis med cetificat		
	956 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav)		
	3341 Tons Have/park flis uden certificat (Ingen krav)		
Pillekedelerne har brugt	156 Tons piller		
Fliskedelen har brugt	0 Tons piller		
Træpiller købt Year To Date	78 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR)		
Energiforbruget til produktion og transport af flisen	13040 GJ	=	3622 MWh
Energiforbruget for at lave flisen til varme	1797 GJ	=	499 MWh
Energiforbruget til distribution	814 GJ	=	226 MWh
<u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u>			
Renset spildevand fra processen	7518 m3		
Aske kørt til deponi	0 Tons		
Aske brugt til gødning af jorden	99 Tons		
<u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u>			
Natronlud	10400 kg		
Polyaluminiumklorid	4800 kg		
Saltsyre	46 kg		
Metclear 15	0 kg		
Flokkuleringsmiddel	175 kg		
HydroX	180 kg		
